



Marché ou affaire :

FORT DE VAUJOURS

PLACOPLATRE

Date de l'intervention :

30 août 2017

Canalisation zone A2 – A3

Diagnostic de contamination pyrotechnique

Rapport d'intervention

R N°242-01-FH/17/EOD-EX du 30/08/2017

	Identité	Date	Visas
Validation	Franck HISSIGER Conducteur de travaux EOD-EX	30/08/2017	

Suivi des évolutions

Indice	Nom rédacteur, date	Modifications
	Franck HISSIGER, 30/08/2017	Création du document

Liste de diffusion

Destinataires	Identité	Nombre d'exemplaires
ARTELIA	M. CHOULET	1 (informatique)
PLACOPLATRE	M. MIISRADIS M. PAYS	2 (informatique)
ESP CONSEIL	M. KRUSZEWSKA	1 (informatique)
ECAPS	M. TEXANDIER	1 (informatique)
EOD-EX	M. CHARLES archivage	1 (informatique) et archivage

Détail des modifications apportées au document (indice xx)

Demandeur :	Néant
Référence :	Néant

Modifications apportées au document
Néant

Table des matières

1	OBJET DE L'INTERVENTION	4
2	DESCRIPTION DE L'INTERVENTION	4
2.1	PARTICIPANTS A L'INTERVENTION	4
2.2	CONDITIONS D'INTERVENTION	4
2.3	OBJECTIFS DE L'INTERVENTION	4
2.4	CARACTERE PREVU OU NON PREVU DE L'INTERVENTION	4
2.5	PHOTOGRAPHIES DU SITE.....	4
2.6	AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES.....	4
3	ZONE TRAITEE.....	5
3.1	PLAN DE LA ZONE TRAITEE.....	5
3.2	TESTS EXPRAY	5
3.3	EXTRAIT DE VISUALISATION DES TESTS EXPRAY	6
4	CONCLUSION	6

1 OBJET DE L'INTERVENTION

L'intervention objet du présent rapport s'inscrit dans le cadre de la libération des canalisations.

Elle concerne la détection des contaminations pyrotechniques avant déconstruction et retrait des canalisations, traitée telle que décrit dans le mode opératoire « Procédure de traitement des canalisations N°073-01-FH/17/EOD-EX du 14/03/2017 ».

Les travaux ont été réalisés sur la période du 12 au «30 août 2017 ;

2 DESCRIPTION DE L'INTERVENTION

2.1 Participants à l'intervention

- Franck HISSIGER, conducteur de travaux en dépollution pyrotechnique.

2.2 Conditions d'intervention

- Tests de présence de produits explosifs avant chaque retrait de tronçon.

2.3 Objectifs de l'intervention

- Mettre en évidence la présence de produits explosifs à l'intérieur des canalisations,

2.4 Caractère prévu ou non prévu de l'intervention

- Le site s'est révélé parfaitement libre d'accès.

2.5 Photographies du site


- Extrait des photographies des tests réalisés, jointes au présent rapport.

2.6 Autres informations importantes

- Néant

3 Zone traitée

3.1 Plan de la zone traitée

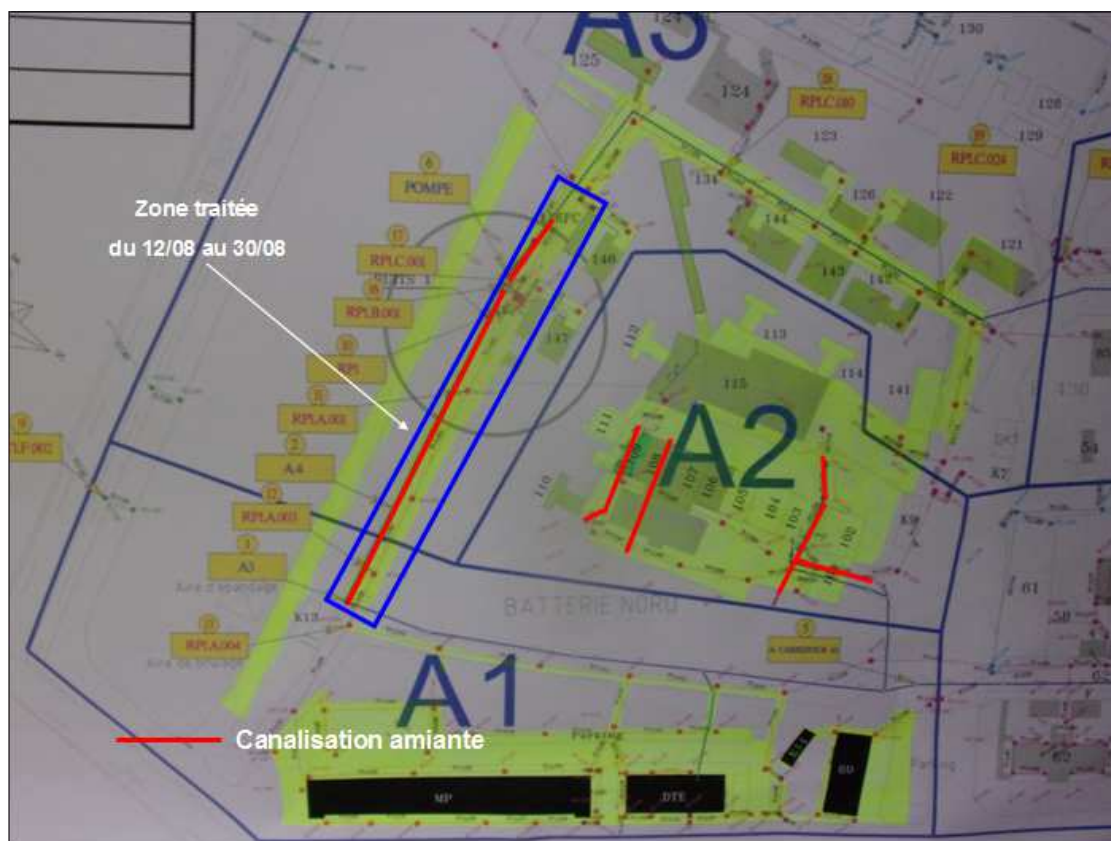

Toutes les canalisations situées dans la zone matérialisée en bleu ont été diagnostiquées avant leur retrait.

Les canalisations matérialisées en couleur rouge sont les conduits amiantés.

3.2 Tests EXPRAY

En zone A3 zone au contour bleu, 72 tests EXPRAY ont été réalisés dont 48 tests en condition normale et 24 tests en condition amiante.

3.3 Extrait de visualisation des tests EXPRAY



Test EXPRAY en condition amiante

4 CONCLUSION

A ce jour sur les 201 tests EXPRAY réalisés, aucunes traces de contamination par la présence de produits explosifs n'ont été mises en évidence à l'intérieur des canalisations.
